



Expediente N° 2022-10-3-0001538

Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

N° OID:  
2.16.858.2.10002652.66570.2022103.0001538

Prioridad: **Normal**  
Acceso restringido: **No**

---

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Oficina origen:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto:

DEPARTAMENTO CONTRATACIÓN DE OBRA NACIONALES REMITE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PERIODO DICIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022 - EMPRESA INCOCI SA - LICITACIÓN C/123 - MESA DE ENTRADA UNIFICADA -

---

Fecha iniciado: 20/04/2022 17:33:09

Fecha valor: 20/04/2022

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

---

## Resumen de actuaciones clasificadas

<b>Nro. Actuación</b>	<b>Oficina</b>	<b>Usuario</b>	<b>Clasificación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Folio Inicio</b>	<b>Folio Fin</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------------	--------------	-------------------------	----------------------

## Lista de vinculaciones del expediente

<b>Relación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Nro expediente</b>	<b>Fecha Vinculación</b>
-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

## 9° ITGA C/123

PABLO CABRERA

Responder a todos |

Hoy, 10:44

MTOP - Mesa de Entrada Unificada

9 - Nota Elevación ITGA ...  
353 KB

9 - ITGA C123 Dic21Ene...  
3 MB

2 archivos adjuntos (3 MB) Descargar todo

Estimados buen día, les envié documentación para realizar expediente electrónico. Se agradece que el mismo sea dirigido a Martin Goyeneche.

Saludos

**Pablo Cabrera**  
**Administrativo**

División Construcciones  
Dpto Contratación de Obras Nacionales  
Dirección Nacional de Vialidad - MTOP-  
Rincón 575, Montevideo, UY  
<tel:29158333>- int 20820

---



Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Piedras Coloradas, 7 de abril de 2022

**GERENCIA CONSTRUCCIONES**

Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente:

**Ref. :** LIC. C/123 "Ruta 90 - Tramo: Piedras Coloradas - Ruta 25"

**Asunto:** ITGA N° 9, Diciembre 2021 – Enero – Febrero 2022

De mi mayor consideración:

Se eleva ITGA del Asunto, de fecha marzo de 2022 de la empresa contratista INCOCI SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

**Ing. Javier Montans**  
DIRECTOR DE OBRA  
D.N.V. - M.T.O.P.



9NO. INFORME TRIMESTRAL

Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas  
(48km000) – Empalme Ruta N°25 (70km30)

Período: diciembre 2021, enero y febrero 2022.

*Marzo 2022*

**9no Informe trimestral – diciembre 2021, enero y febrero 2022.**  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



*Indice*

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTE DE OBRA	1
3.	TRABAJOS REALIZADOS	3
4.	GESTIÓN DE CANTERAS	3
5.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	3
5.1	Servicios Higiénicos	3
5.2	Consumo de agua	4
5.3	Gestión de residuos sólidos	4
5.4	Abastecimiento de combustible	5
5.5	Materiales	5
6.	EQUIPOS	5
7.	PLANTILLA DE PERSONAL	5
8.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5
9.	AUDITORIAS AMBIENTALES	5
10.	CONTINGENCIAS	6
11.	AUTORIZACIONES	6
12.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	6

**9no Informe trimestral – diciembre 2021, enero y febrero 2022.**  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



## **1. INTRODUCCIÓN**

Se describen a continuación los principales trabajos realizados en el noveno trimestre de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente del Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado por el BID.


## **2. OBRADOR Y FRENTE DE OBRA**

Previendo la ampliación correspondiente de la Licitación C115, es que en el mes de febrero se realizó traslado del Obrador a un nuevo sitio ubicado estratégicamente cercano al tramo donde se ejecutarán las actividades. La distancia entre el obrador anterior y el actual es de 9km aprox. Este último cuenta con oficinas para uso de la Empresa, oficina para uso de inspección de obra, vestuarios y baños, depósito de herramientas, depósito de lubricantes y zona de acopios. En este predio también se instaló la Planta Asfáltica para la ampliación antes mencionada.


La ubicación es en el padrón N° 8.786 de la tercera seccional del Departamento de Paysandú, con frente al 67km de la ruta N° 90.

El campamento de obra que se encontraba en el padrón N°10.908 se conservará para la disposición de los depósitos de emulsión para un futuro tratamiento de banquetas.

9no Informe trimestral – diciembre 2021, enero y febrero 2022.  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).

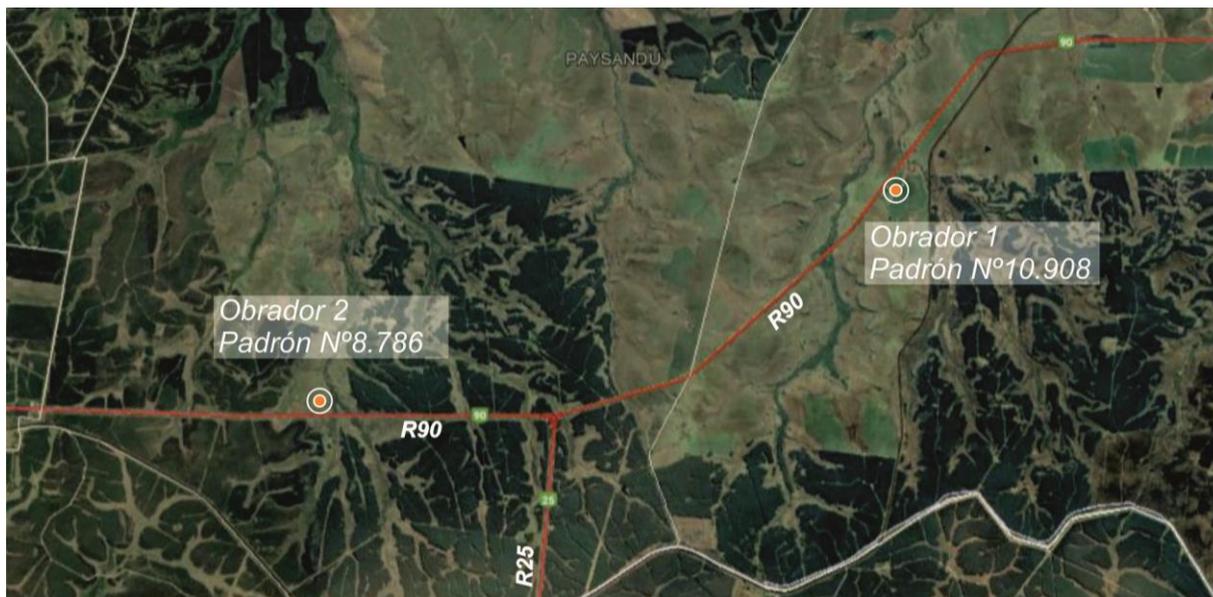

Ubicación del obrador anterior y el nuevo

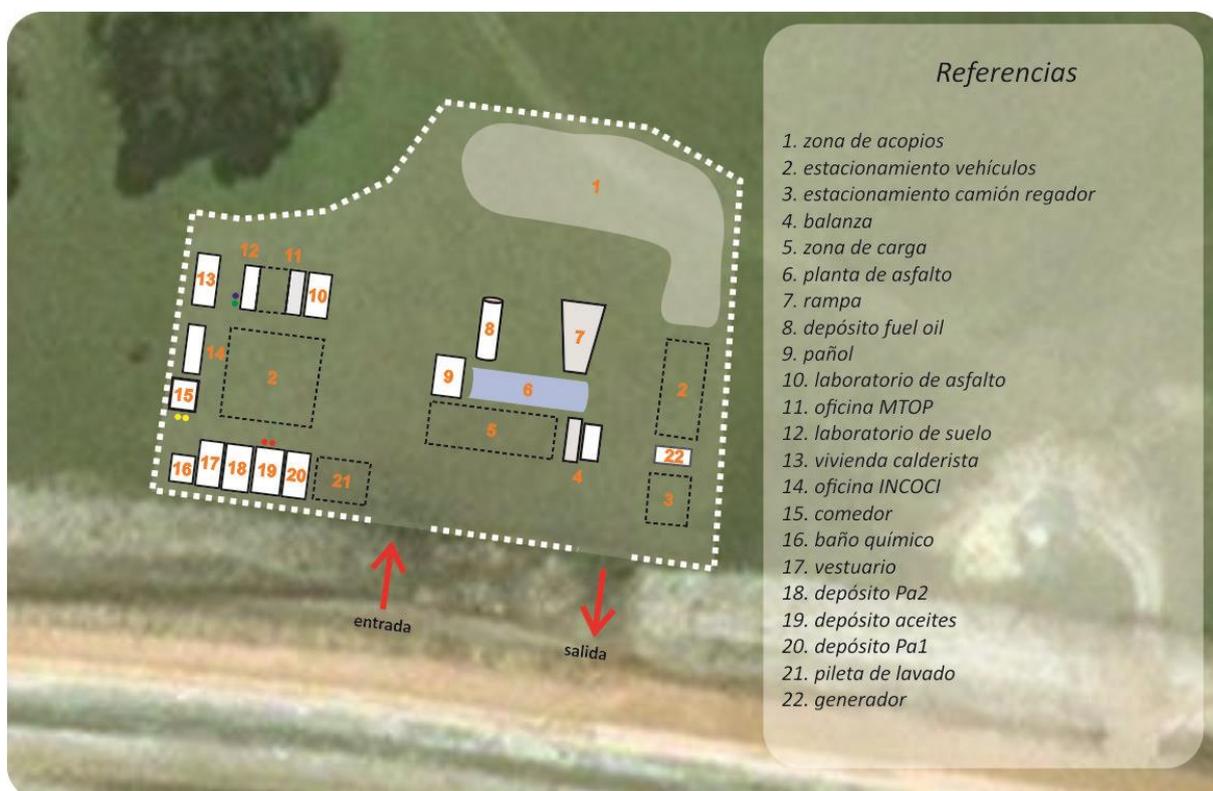

Esquema obrador nuevo – Padrón N° 8.786

9no Informe trimestral – diciembre 2021, enero y febrero 2022.  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



Registro fotográfico del nuevo obrador – Padrón N° 8.786

### 3. TRABAJOS REALIZADOS

Durante el trimestre de referencia, se realizaron tareas de reciclado de material de base con aporte de cemento portland y riego de imprimación ejecutando los correspondientes riegos de niebla sobre el tratamiento.

### 4. GESTIÓN DE CANTERAS

La cantera de obra pública, con padrón N°1.888 cuenta con AAP y AAO vigente, actualmente en trámite para su ampliación de plazo para la ampliación de la Licitación C115.

### 5. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

#### 5.1 Servicios Higiénicos

Para los efluentes de aguas servidas, el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento continúa siendo realizado por la barométrica habilitada del Municipio Departamental de Guichón.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la empresa “Rivero”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

**9no Informe trimestral – diciembre 2021, enero y febrero 2022.**  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



## 5.2 Consumo de agua

El agua de producción es proveniente del Aº Ñacurutú Grande.

El agua para uso sanitario en obrador, también se utiliza agua del arroyo Ñacurutú con las indicaciones correspondientes para ser potable, contenido en tarrinas de 1000L desde donde se distribuye gravitatoriamente al punto de entrega.

Se continúa a la espera de la resolución por parte de DINAGUA sobre la solicitud de renovación de la toma y uso de aguas.

Con respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en dispensadores.

## 5.3 Gestión de residuos sólidos

Se continúa clasificando los residuos en asimilables a domésticos, reciclables y peligrosos. Los primeros son enviados semanalmente al vertedero Municipal de Guichón. Los residuos reciclables como nylon - plástico y papel - cartón también se clasifican para luego ser enviados a ECOPUNTO recicladora del Departamento de Paysandú.

Los residuos peligrosos como los filtros y trapos contaminados de hidrocarburo se disponen en tachos para luego ser trasladados al taller de INCOCI ubicado en la ruta 57 (57km000) de la ciudad de Trinidad. Desde allí son gestionados por la empresa habilitada.

Con respecto a las baterías, los neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado se gestionan de la siguiente manera:

Gestores habilitados:

- Neumáticos: Geneu
- Baterías: Obracel
- Tierra contaminada: Werba
- Chatarra: LAISA
- Aceite Usado: Petromóvil
- Filtros y Trapos sucios (hidrocarburo): Márgenes del Río

**9no Informe trimestral – diciembre 2021, enero y febrero 2022.**  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



#### **5.4 Abastecimiento de combustible**

Tal como se ha mencionado en informes anteriores, el suministro de combustible continúa siendo realizado a través de un camión surtidor del proveedor ANCAP a una cisterna de la Empresa la cual surte a las máquinas de la empresa. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

#### **5.5 Materiales**

Cemento Portland: Cielo Azul

#### **6. EQUIPOS**

Durante el trimestre, el equipo destinado a la obra estuvo compuesto por:

Motoniveladora, distribuidor de portland, reciclador, compactador pata de cabra, cilindro compactador, compactador neumático, regador de agua, regador de asfalto, barredora y Gravilladora.

#### **7. PLANTILLA DE PERSONAL**

Durante el trimestre, el promedio de personal afectado a la obra ha sido de 26 personas, entre las que se encuentran: apuntador, encargado de cuadrilla, maquinistas, choferes, banderilleros, laboratorista y operarios de apoyo.

#### **8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN**

En los meses de referencia no hubo nuevos ingresos, por lo que el equipo de SGI no realizó capacitaciones de inducción en Gestión ambiental.

#### **9. AUDITORIAS AMBIENTALES**

En el mes de noviembre se realizó Auditoria Ambiental por parte del MTOP, siendo recibido el informe en el mes de enero del 2022 presentando informe de respuesta el día 24 del mismo mes.

Se detectó una No conformidad, cuyo enunciado es el siguiente:

**9no Informe trimestral – diciembre 2021, enero y febrero 2022.**  
Licitación C/123 – Ruta N°90, Tramo: Piedras Coloradas (48km000) –  
Empalme Ruta N°25 (70km30).



*ID 01: Se encuentran zonas de acopio en faja sin autorización por escrito del DDO.*

*Acopio 1 (Lat. 32°22'51.87"S, Long. 57°29'32.72"O).*

*Acopio 2 (Lat. 32°23'29.08"S, Long. 57°24'43.86"O) (progr.67K250).*

Se adjunta al presente documento, la respuesta por parte de la Empresa.

## 10.CONTINGENCIAS

Por el momento no se han registrado ninguna contingencia durante el período que corresponde al presente ITGA.

## 11.AUTORIZACIONES

Se adjuntan al presente informe las siguientes autorizaciones:

- Autorización propietario para instalación de obrador
- Autorización por parte del MTOP para el nuevo obrador

## 12.TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Las tareas previstas para el próximo trimestre será culminar con las actividades de reciclado en los tres km restantes para luego comenzar con las tareas de pavimentación con carpeta asfáltica correspondiente a la ampliación de la Licitación C115.

## RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA	FECHA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur	-
Revisado y Arrobado	Gerente de Obra: Ing. Eduardo Scattolini	23/03/2022

Martín Gabriel Rivero Zeni

**Rivero**

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948 / Paysandú



RUT 120285740017  
**REMITO INTERNO**

Serie A

**N° 003065**

RUT COMPRADOR		C/FINAL	FECHA		
			25	04	2022

Remitente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE
1	Impresora de Biotop Quince

SILVEIRA RUT 120196200017  
Remito Interno - A 2951 / A 3450 x2 vias  
11/2021  
Imprenta autorizada - Tel.: 4722 6145  
1° Blanca - Original / 2° Color - Archivo

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Puede verificar comprobante en <https://>

Martín Gabriel Rivero Zeni

# Rivera

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948 / Paysandú



RUT 120285740017  
**REMITO INTERNO**

Serie A

**N° 003065**

RUT COMPRADOR	C/FINAL

FECHA		
25	04	20

Remitente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE
1	Luz de baño Quirico

SILVEIRA RUT 120196200017  
Remito Interno - A 2951 / A 3450 x2 vias  
11/2021  
Imprenta autorizada - Tel.: 4722 6145  
1° Blanca - Original / 2° Color - Archivo

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

# Rivera

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948 / Paysandú

## REMITO INTERNO

Serie A

### N° 003087

RUT COMPRADOR	C/FINAL

FECHA		
09	02	22

Remitente: INCOVI

Dirección: Cta 90 (AF 60 (KRAOS))

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE
	<u>Imprenta de libro...</u>

SILVEIRA RUT 120196200017  
 Remito Interno - A 2951 / A 3450 x2 vías  
 11/2021  
 Imprenta autorizada - Tel.: 4722 6145  
 1° Blanca - Original / 2° Color - Archivo

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Cédula: Kausch Juan

Martin Gabrio

# Rivero

Grito de Asencio 1536  
Telefax 472 28948 / Paysandú

## REMITO INTERNO

Serie A

### N° 003182

RUT COMPRADOR	C/FINAL	FECHA		
		23	02	22

Remitente: INCOCA

Dirección: Ruta de los Arboles

Destinatario: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE
	<u>Impresión de Bio Asencio</u>

SILVEIRA RUT 120196200017  
Remito Interno - A 2951 / A 3450 x2 vías  
11/2021  
Imprenta autorizada - Tel.: 4722 6145  
1° Blanca - Original / 2° Color - Archivo

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

 <b>INCOCI</b>	REGISTRO DE SGI	Código: RC 7571b
	<b>CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>	
Fecha: <u>19-01-22</u>	REF: IT 7113	Revisión: 2
Receptor de Residuos:		
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN entregado por INCOCI SA: <u>150 LT</u>		
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO entregado por INCOCI SA: <u>100 LT</u>		
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMESTICOS entregado por INCOCI SA: <u>50 LT</u>		
Cantidad de Residuos PELIGROSOS entregado por INCOCI SA:		
FILTROS:	TRAPOS SUCIOS:	OTROS:
Cantidad de NEUMÁTICOS fuera de uso entregado por INCOCI SA:		
Sector / Obra:		
Firma del que entrega:	Firma del que recibe: <u>[Signature]</u>	
Aclaración de firma:	Aclaración de firma: <u>JULIO BRUNO</u>	



**ORDEN DE SERVICIO**

N° 003735

CARMELO DE ARZADUM 5990  
 MONTEVIDEO - URUGUAY  
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984  
 E-mail: info@petromobil.com.uy  
 Web: www.petromobil.com.uy

**MATRICULA DEL CAMION EN SERVICIO**

SIP 4442



**FECHA DE SERVICIO**

14 / 1 / 2022

**Datos de Cadena de Gestión**

<b>GENERADOR</b> Fecha 14 / 1 / 2022 Hora 10 / 10	Empresa: INCOCI R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto ROST & KUST	Firma/ Aclaración 
<b>TRANSPORTISTA</b> Fecha 14 / 1 / 2022 Hora 10 / 40	Empresa: Petromovil Ltda. R.U.T.: 21 098074 0010	Dirección/ Teléfono Contacto Carmelo de Azardum 5990 2304 4974	Firma/ Aclaración 
<b>ACOPIO</b> Fecha  Hora  	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto  	Firma/ Aclaración 
<b>DESTINO FINAL</b> Fecha  Hora  	Empresa: R.U.T.:	Dirección/ Teléfono Contacto	Firma/ Aclaración

**Datos de Residuos**

Descripción	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
ACEITE EN RESUSO	1 x / II	600 LITROS	
	___ / II		

MULTISELLOS - H. GILLARDO Y CIA. S.R.L. - TEL: 2903 1378 - ORDEN DE SERVICIO - del 3.501 al 3.750 x 4 vías - 11/2021



**MARGENES DEL RÍO S.A.**  
 Servicios Ambientales  
 Haití 1500 | Montevideo, Uruguay | Tel.: 2311 1683  
 www.margenesdelrio.com

N° 2367

FECHA  
 28/9/22

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES**

DATOS IDENTIFICATORIOS		
GENERADOR	Empresa: <b>INGOCI</b>	Dirección:
GESTOR	Empresa:	Dirección:
TRANSPORTISTA	Empresa: <b>MANOFACT</b>	Matrícula: Vehículo:
OPERADOR	Márgenes del Río S.A. Haití 1500 - PTI Cerro	2311 16 83 Habilitación Ambiental Operativa N° 182/2021 y renovaciones.

DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO					
TIPO	ESTADO	EMBALAJE	KG. LTSÓ UN	BULTOS	OBSERVACIONES
<b>TICMA</b>	<b>SOLIDO</b>	<b>BOLETA</b>	<b>10 kg</b>	<b>1</b>	<b>KYMSOL</b>
<b>TIAROS</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓ PESAL</b>		
<b>ENVASES</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>		
<b>FUMOS</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>		

CERTIFICACIÓN		
GENERADOR	GESTOR	OPERADOR
<i>Guillermo Gómez García</i> firma		<i>[Signature]</i> firma
ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO	ACLARACIÓN/SELLO

Este residuo se recibe según la declaración del generador en cuanto a su clasificación y peligrosidad

TMS Impresos - Tel.: 2402 9999 - 06/2021 - 2.251 / 3.250 x 2c - www.msimpresos.com

Bianco - Rosado

**OBRA PUERTO UPM**  
**ENTREGA A DANIELA**  
GRACIAS



Trinidad, 24 de enero del 2022

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

**Auditor: Carmen Delfino**

**Director de Obra: Ing. Javier Montans**

**Presente:**

**Ref.: C/115– Rehabilitación de Ruta 90, Tramo Ruta 25 – Guichón**

**C/123 – Rehabilitación de Ruta 90, Tramo Piedras Coloradas – Ruta 25**

**INFORME AMBIENTAL**

Por la presente elevamos a Ud. Las medidas adoptadas en respuesta a la No Conformidad ID.01, planteada en el Informe de Auditoría Ambiental por DICA & Asociados.

Fecha de la visita: 09/11/2021

Fecha del informe: 24/12/2021

Fecha de recibido: 21/01/2022

OFICINA CENTRAL

📍 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

☎ 43646000    ✉ [oci@incoci.com.uy](mailto:oci@incoci.com.uy)





## NO CONFORMIDAD

*Se encuentran zonas de acopio en faja sin autorización por escrito del DDO.*

*Acopio 1 (Lat. 32°22'51.87"S, Long. 57°29'32.72"O).*

*Acopio 2 (Lat. 32°23'29.08"S, Long. 57°24'43.86"O) (progr.67K250).*

Para las zonas en la faja pública destinadas para acopio o disposición de maquinaria utilizada durante las distintas etapas de ejecución se solicitó la autorización correspondiente por parte del Director de Obra, presentado en el ITGA del mes de diciembre del 2021 con fecha correspondiente.

Respecto a los acopios de materiales o residuos no generados por la Empresa pero que de todas formas se encuentran en la faja pública al momento de adjudicada la Obra, se detecta como análisis de la causa la falta de internalización por parte de los mandos medios y de la Responsable de Gestión Ambiental, la planificación y relevamiento previo a las actividades para la resolución de la disposición final o de los mismos. Es por ello que se realizó una capacitación sobre la temática dirigida al Director de Obra y el capataz.

Como acciones inmediatas adoptadas, se plantearon las siguientes:

- Comunicación por parte del Director de Obra, el Ing. Javier Montans con el Jefe de la Regional N°6, el Ing. Jorge Galusso solicitando autorización del acopio ubicado en las progresiva 81km100 de la Ruta 90 tal como se detalla en el informe de la No Conformidad.
- Las Defensas metálicas ubicadas en la progresiva 67km250 lado A (-) serán acopiadas en esa ubicación hasta ser trasladadas al Depósito de la Empresa en la Ciudad de Trinidad para ser gestionadas como chatarra en gestor habilitado por DINACEA. Actualmente se mantiene la zona para posibles acopios de la Licitación C123.

### OFICINA CENTRAL

📍 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

☎ 43646000    ✉ [oci@incoci.com.uy](mailto:oci@incoci.com.uy)







Ministerio  
de Transporte  
y Obras Públicas

Piedras Coloradas, 20 de setiembre de 2021

INCOCI S.A.

Ing. Nicolás Alvez

Presente:

**Ref.:** LIC. C/123 "Ruta 90 - Tramo: Piedras Coloradas - Ruta 25"

**Asunto:** Autorización Obrador y Planta asfáltica

De mi mayor consideración:

A los efectos del cumplimiento a lo establecido en el Manual Ambiental, se autoriza la instalación del nuevo obrador y la planta asfáltica para la obra de referencia, ubicados en el padrón N° 8.786 del Departamento de Paysandú, propiedad del Sr. Manuel Abraham, sobre Ruta 90 en la progresiva 67K000.

Finalizadas las tareas mencionadas anteriormente, se reacondicionará el área afectada de acuerdo a los lineamientos del Manual Ambiental.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

**Ing. Javier Montans**  
DIRECTOR DE OBRA  
D.N.V. - M.T.O.P.



Trinidad, 2 de febrero del 2022

Sr. Manuel Abraham

Presente

De nuestra consideración,

La Empresa INCOCI S.A, adjudicataria de la Licitación: C/123 – Ruta N°90 Tramo: Piedras Coloradas (48km000) – Empalme Ruta N°25 (70km30) solicita autorización por parte del propietario del padrón N° 8.786 para la instalación del obrador y la planta asfáltica de la Empresa por el período de 6 meses aproximadamente.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

  
Arq. Daniela Zacur

Responsable del Sistema de Gestión Integrado

Por INCOCI S.A

Firma Propietario: 

OFICINA CENTRAL

📍 Dr. Luis A. de Herrera 519, Trinidad, Flores

☎ 43646000 ✉ [incoci@incoci.com.uy](mailto:incoci@incoci.com.uy)



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	20/04/2022 17:39:27	
Tipo:	Enviar	

*Se envía para prosecución del trámite.*

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2022-10-3-0001538-_Mail ITGA C 123.pdf	Sí
2	2022-10-3-0001538-_9 - Nota Elevacion ITGA C123 Dic21EneFeb22.pdf	Sí
3	2022-10-3-0001538-_9 - ITGA C123 Dic21EneFeb22.pdf	Sí

Firmante:
TEJERA ESPINOSA, CARMENCITA BEATRIZ

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	02/05/2022 11:21:54	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/123 periodo Dic 2021 - Feb 2022, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/05/2022 19:08:33	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	20/05/2022 10:20:44	
Tipo:	Elevar	

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento sugiriendo la remisión de los presentes obrados a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.

Actuante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	20/05/2022 12:18:25	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	20/05/2022 12:18:24	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	20/05/2022 12:41:24	
Tipo:	Elevar	

Con lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, se envía a Asesores del Sr. Ministro, para su conocimiento y consideración.-

Firmante:
ROMEUI, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	MINISTRO - 10/000/00000000	
Fecha:	04/07/2023 21:31:29	
Tipo:	Enviar	

Habiendo tomado conocimiento, remítase el expediente a la Corporación Vial del Uruguay S. A.

Firmante:
GONZALEZ, CARLOS ORIBE

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	05/07/2023 15:05:43	
Tipo:	Firmar	

***DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA***

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., como está sugerido a foja 29.---

Actuante:
LESCHENKO CARAMBULA, IBANA
Pase a Firma
SOLER MALLO, GRACIELA RITA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	05/07/2023 15:09:04
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
SOLER MALLO, GRACIELA RITA	05/07/2023 15:09:04	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2022-10-3-0001538
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	
Fecha:	05/07/2023 16:01:10	
Tipo:	Enviar	

Siga para la prosecución del trámite.-

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS
