


12VO. INFORME TRIMESTRAL

CREMAF / Consorcio Vial Ruta 5 – Tramo II

Período: julio, agosto, setiembre 2025

Octubre 2025

 Dr. Luis A. de Herrera 519 | Trinidad | Flores

 +598 4364 6000

 incoci@incoci.com.uy



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBRADOR Y FRENTES DE OBRA	2
2.1	Pileta de lavado	2
3.	TRABAJOS REALIZADOS	3
4.	GESTIÓN DE CANTERAS	4
5.	PROVEEDORES	5
6.	REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL	5
6.1	Servicios Higiénicos	5
6.2	Consumo de agua	5
6.3	Gestión de residuos sólidos	6
6.4	Mantenimiento de equipos	7
6.5	Lavado de equipos	7
6.6	Abastecimiento de combustible	7
7.	INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES	7
8.	EQUIPOS	7
9.	PLANTILLA DE PERSONAL	8
10.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8
11.	INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL	8
12.	AUDITORIAS AMBIENTALES	8
13.	CONTINGENCIAS	8
13.1	Derrames	8
13.2	Incendios	9
14.	SUBCONTRATOS	9
15.	TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	9
16.	ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES	9
17.	RESPONSABLES DE ELABORACIÓN	10
18.	ANEXOS	11
	Constancia de mantenimiento de equipos	17
	Constancia de gestión de residuos CAT I	19

<i>Constancia de gestión de residuos CAT II.....</i>	<i>21</i>
<i>Constancia de gestión de BB.QQ.....</i>	<i>22</i>


1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado, se describen los principales trabajos realizados en el trimestre número doce y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

El presente informe se refiere al ítem II y la culminación del Ítem III.

Por otro lado, el ítem IV, que corresponde a las Rutas 76 y 77, se presenta de manera separada.

Se deja constancia que nuestra gestión está alineada a las pautas planteadas en la realización de las actividades, referentes a aspectos relacionados con la protección ambiental específicamente en el Manual Ambiental de la DNV y de acuerdo con lo expresado en la R.M 809/2022 – Expte. 2021/002523 y el documento EM2021/36001/002523 del Ministerio de Ambiente.

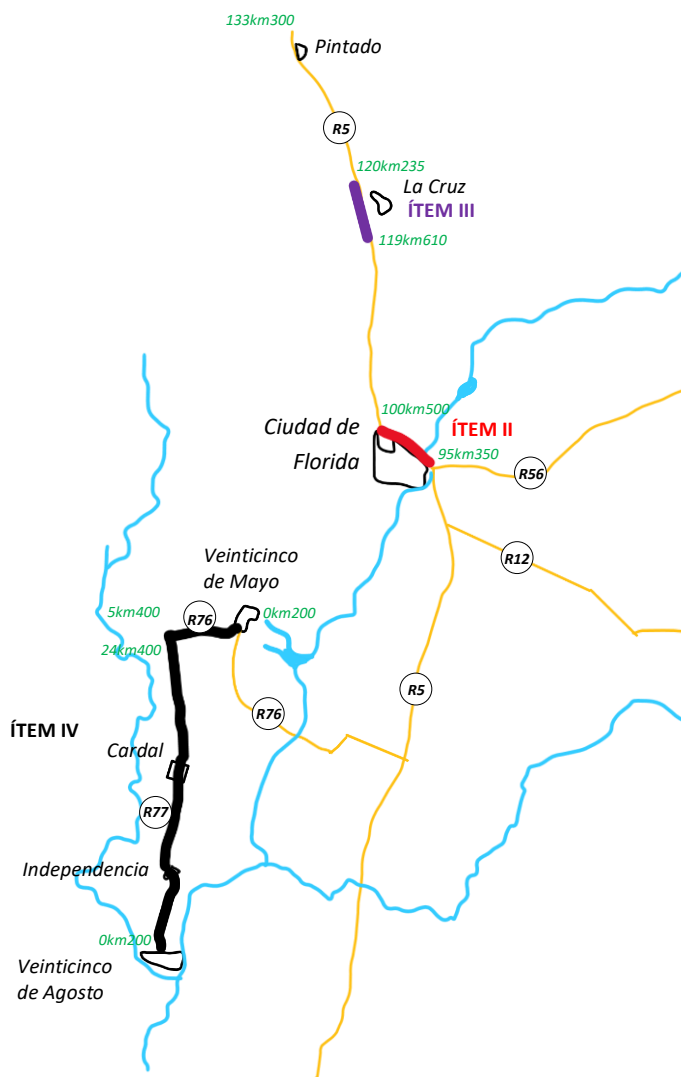

2. OBRADOR Y FRENTERES DE OBRA

El obrador ubicado en el padrón rural Nº 3.934 propiedad del Sr. Alí Amed, sobre Ruta 5 en el 107km000, a unos 8.5km aprox. de la Ciudad de Florida, Departamento de Florida, conformado por oficinas para el personal técnico y para el MTOP, vestuarios y servicios sanitarios, comedores, depósito de herramientas, laboratorios, depósito de aceites y lubricantes, zona para acopio de materiales, planta de hormigón, pileta de lavado para mixer de hormigón y herramientas, área de disposición de residuos y estacionamiento de vehículos.



2.1 Pileta de lavado

Se emplea con menor frecuencia debido a la disminución en la producción de hormigón, lo que ha reducido la utilización de la pileta de lavado. De todas formas, se continúa aplicando el sistema de reciclaje de agua mediante la instalación de una bomba y una red de tuberías que dirigen el agua utilizada hacia un tanque australiano, el cual almacena el agua residual de manera adecuada para su posterior reutilización en el proceso de elaboración del hormigón, lo que contribuye significativamente a la reducción del consumo de recursos hídricos y a la optimización de nuestros procesos productivos.

3. TRABAJOS REALIZADOS

Ítem II

En el tramo urbano se continuó con el movimiento de suelos en la zona del intercambiador de Calle 60 entre las progresivas 100.100 y 99.500 y se ejecutaron bases y pavimentos en ambos carriles del lado (-) entre las progresivas 100.500 y 100.100. Se ejecutó también bases y pavimentos en parte de la Rotonda N y rama NW del Intercambiador de Calle 60.

Finalización Ítem III

Durante el trimestre se completaron los pavimentos de hormigón de ambos carriles del lado a (+) entre las progresivas 119.550 al 120.664 dando por finalizadas las tareas de pavimentación.

Asimismo, se iniciaron las labores de señalización horizontal y vertical, así como la colocación de defensas metálicas, cuya finalización está prevista para el mes de octubre, previo a la habilitación al tránsito del tramo mencionado.

Se procedió al retiro de los vestigios existentes, se retiraron todos los residuos generados por la obra, dejando el área debidamente acondicionada y con taludes estables.

A continuación, se adjuntan fotos de la situación actual.





4. GESTIÓN DE CANTERAS

Durante los meses de referencia, se extrajo material granular de las siguientes canteras:

Cantera	Vencimiento /Comentario	Evidencias
3.874 (Piedra)	04/2026	La AAO de la ampliación se adjunta al presente documento
6.454 (Tosca)	12/2025	AAO presentado en el 7mo ITGA
19.771 (Tosca)	11/2025	AAO se adjunta al presente documento

Cantera Padrón N° 3.874

La Autorización Ambiental de Operaciones (AAO) correspondiente a la solicitud de ampliación fue recibida el 24 de octubre de 2025, manteniendo su vigencia hasta abril de 2026.

5. PROVEEDORES

Hierro conformado: GERDAU

Hormigón premezclado: VIALMIX

Cemento Portland: CIELO AZUL

Acelerante y curador para el hormigón: SIKA

Arena: Empresa Brillo Arena y acopio de extracción a cargo del propietario del predio N°9.166, el Sr. José Ortega contando con autorización correspondiente ya adjunta en ITGA anteriores.

Madera: MADERERA FLORIDA

Caños de hormigón: BERMAC

Emulsión Imprimante: BITAFAL

6. REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 Servicios Higiénicos

Para los efluentes de aguas servidas, el destino es un pozo negro, cuyo mantenimiento es realizado por barométrica habilitada. En el presente trimestre no se solicitó servicio.

El mantenimiento de los baños químicos está a cargo de la Empresa “A&C”, contando con habilitación de OSE correspondiente.

6.2 Consumo de agua

El agua de producción es proveniente de distintas tomas, las cuales fueron solicitadas de autorización ante DINAGUA.

A la fecha contamos con Permiso de extracción por DINAGUA de los A° Pintado y A° Calleros, adjunto en ITGA anteriores.

Respecto al consumo de agua para uso sanitario en el obrador, contamos con la autorización por parte de DINAGUA correspondiente al pozo ubicado en el mismo predio. Respecto al consumo de agua del personal, se suministra agua potable en bidones.

6.3 Gestión de residuos sólidos

Residuos Asimilables a Domésticos

Los residuos asimilables a domésticos son enviados de manera semanal al vertedero Municipal de Florida, siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos y con la correspondiente autorización para su disposición presentada en el 1er ITGA.

Durante el primer trimestre del año, se generaron los siguientes volúmenes de residuos asimilables a domésticos:

- Julio: 300 litros
- Agosto: 600 litros
- Setiembre: 450 litros

Residuos No Asimilables a Domésticos (Papel, Cartón, Nylon y Plástico)

Son gestionados por separado. Durante el trimestre de referencia, se generaron los siguientes volúmenes de estos materiales:

Papel y cartón:

- Julio: 300 litros
- Agosto: 600 litros
- Setiembre: 400 litros

Nylon y plástico:

- Julio: 300 litros
- Agosto: 400 litros
- Setiembre: 400 litros

Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos, tales como filtros y trapos contaminados con hidrocarburos, son manejados con especial atención. En el presente trimestre, no se gestionaron.

Otros Residuos

En lo que respecta a otros residuos como neumáticos, tierra contaminada, chatarra y aceite usado, se gestionó aceite usado y chatarra. La empresa PETROMOBIL gestionó 800 litros de aceite usado, según la evidencia adjunta.

6.4 Mantenimiento de equipos

Los mantenimientos de los camiones y equipos de INCOCI se realizan en el taller de la Empresa ubicado en la Ciudad de Trinidad o en el galpón del obrador teniendo la infraestructura adecuada para tal actividad.

Se adjuntan al presente documento, los registros correspondientes.

En el caso de los fleteros subcontratados ver capítulo 14 – Subcontratos.

6.5 Lavado de equipos

Se lleva a cabo el lavado de las ruedas de los equipos con el objetivo de eliminar el barro acumulado durante su uso, previa verificación de la ausencia de fugas de aceite o líquido hidráulico en el equipo. En esta instancia, dicha operación se realiza ya sea en el galpón techado del obrador, implementando las medidas correspondientes, o en el taller ubicado en Trinidad.

6.6 Abastecimiento de combustible

El suministro de combustible a todos los equipos es realizado a través de un camión surtidor de la Estación de servicio DISA. Se asiste el llenado de las máquinas usando bandejas estancas, de manera de evitar derrames accidentales de combustible.

A continuación, el consumo de combustible por mes:

	Julio	Agosto	Setiembre
Nafta	2414 lts	2014 lts	2431 lts
GasOil	4748 lts	3946 lts	4315 lts

7. INFORMES DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

El agua de bienestar tiene origen del pozo semisurgente ubicado en el obrador. El agua cumple con los parámetros exigidos según el Dec.375/011.

8. EQUIPOS

Durante el presente trimestre, los equipos destinados a la obra fueron los siguientes:

Camiones utilitarios, camiones doble eje con volcadora, retroexcavadora combinada, excavadoras sobre bandas, excavadoras sobre neumáticos, motoniveladoras, compactadores (lisos y pata de

cabra), rodillos neumáticos, bulldozer, cargadores frontales, recicladora de suelos, esparcidor de cemento, barredora sopladora, camión regador de asfalto, triturador móvil primario, triturador móvil secundario, zaranda móvil, perforadora de roca y pavimentadoras de hormigón.

9. PLANTILLA DE PERSONAL

Durante el trimestre de ejecución de los trabajos, el promedio de personal ha sido de 100 personas, entre las que se encuentran: Capataces, encargados de cuadrilla, topógrafos, administrativos de obra, laboratoristas y ayudantes de laboratorio, maquinistas, choferes y operarios en general.

10. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Durante los meses de referencia no se llevaron a cabo capacitaciones de inducción, dado que no se registraron nuevos ingresos de personal.

11. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

Recepción de sugerencias, quejas o reclamos

Este canal será vía WhatsApp, y a partir de cada comunicación se genera un formulario de registro a partir del cual podrá llevarse adelante el tratamiento de acciones y seguimiento.

En el obrador y canteras se colocaron carteles informando la vía de comunicación.

Durante el período mencionado, no se recibieron quejas ni sugerencias por parte de los vecinos respecto a la gestión ambiental.

Radio, TV y diario local

Se utiliza estos canales para la comunicación específica de actividades con impacto significativo para la población de la zona como lo son las alteraciones en servicios públicos, por ejemplo, cortes y desvíos de tránsito o cortes de suministro de agua potable, UTE, etc.

12. AUDITORIAS AMBIENTALES

No se registraron en el trimestre de referencia

13. CONTINGENCIAS

13.1 Derrames

No se registraron en el trimestre de referencia.

13.2 Incendios

Durante el trimestre no han ocurrido incendios.

14. SUBCONTRATOS

VIALMIX

El hormigón utilizado para alcantarillas y hormigonados menores fue suministrado en obra por la Empresa Vialmix, por lo que los camiones mixer son lavados en el emplazamiento de esta Empresa, ubicado a 1,6km de la Ciudad de Florida. En prevención de posibles precipitaciones, el agua pluvial es conducida hacia un depósito especialmente acondicionada con el propósito de almacenarla.

SERVIAM

Continúa con los trabajos de señalización horizontal y vertical en distintos tramos de la obra.

FLETEROS

En el caso de subcontratados se los capacita previo a su ingreso sobre la correcta manipulación y las consideraciones que deben adoptar para tal actividad. Una vez que realizan el mantenimiento, deberán firmar el registro RC 6303b (Mantenimiento de equipos/camiones de subcontratos).

15. TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

En el tramo urbano, en la zona del intercambiador de calle 60 (entre las progresivas 100+500 y 99+500) se prevé finalizar con los trabajos de movimiento de suelos y continuar con las tareas de pavimentación.

Se prevé también comenzar con el movimiento de suelos en el tramo comprendido entre las progresivas 99.500 y 95.350 (pasaje urbano) el que implica un ensanche de plataforma a ambos lados de Ruta 5 existente, para luego ejecutar el reciclado de bases y pavimento de hormigón.

16. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES

No se han llevado a cabo modificaciones.

17. RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

ETAPA	FIRMA
Elaborado	Responsable SGI: Arq. Daniela Zacur
Aprobado	Técnico Ambiental: Ing. Jean Pierre Bidegain

18. ANEXOS

AAO Cantera 19.771



Ministerio
de Ambiente



MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte. 2022/017700
R.M. 1053/2022

Montevideo, 21 NOV. 2022

VISTO: la comunicación realizada por INCOCI S.A., respecto de su proyecto de extracción de minerales, ubicado en el padrón N° 19.771, en la 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida (Exp. 2022/36001/017700);

RESULTANDO: I) que dicha comunicación fue realizada con fecha 30 de setiembre de 2022 proponiendo la clasificación del proyecto en la categoría "A", prevista en el literal "a" del artículo 5º del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que según surge del informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 12 de octubre de 2022 y del Certificado de Clasificación con igual fecha, el proyecto fue clasificado en la categoría "A", correspondiente a actividades, construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes;

CONSIDERANDO: I) que dada la categoría en la que se clasificó el proyecto, corresponde otorgar la Autorización Ambiental Previa, según lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento, sujeto a las condiciones que se dirán;

II) que tratándose de un proyecto minero, sin obra civil ni fase de implantación diferenciada, habrá de otorgarse igualmente la Autorización Ambiental de Operación (artículos 23 y 24 del reglamento);

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020 y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1º. Concédase Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación a INCOCI S.A. RUT 212211750014 para su proyecto de extracción de minerales, ubicado en el padrón N° 19.771, 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida.

2º. Las autorizaciones referidas en el ordinal anterior se conceden sujetas al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente Resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Toda modificación significativa al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, por escrito, para su análisis y eventual aprobación previa.
- b) El titular del proyecto deberá comunicar por escrito a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, con antelación suficiente, la fecha del inicio y finalización de la ejecución del proyecto.
- c) Toda vez que se realice trasiego de combustibles, lubricantes y líquidos hidráulicos en el área de trabajo se deberán colocar materiales absorbentes de hidrocarburos, cubriendo la superficie del suelo en el sitio de operación, que actúen de contención en caso de derrame.
- d) En el caso que se generen residuos Clase I, sólidos o líquidos, como los contaminados con hidrocarburos y oleohidráulicos deberán ser almacenados transitoriamente en recipientes cerrados y dispuestos por gestor autorizado.

3º. Previénese a la interesada que la presente autorización quedará sin efecto, si no se inicia la ejecución del proyecto dentro del plazo legal previsto por el artículo 608 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 (dos años contados a partir de la notificación).

4º. La Autorización Ambiental de Operación se concede por el plazo de 30 (treinta) meses, contados a partir del día hábil siguiente al inicio de la ejecución del proyecto y para un volumen de extracción total de 64.300



Ministerio
de Ambiente

m³ de material, afectando 2 ha.

5º. Esta resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

6º. Notifíquese a la interesada y remítase copia de la presente a la Intendencia de Florida y a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Cumplido, siga al Área Evaluación de Impacto Ambiental a sus efectos.


Adrián Peña Robaina
Ministro de Ambiente

AAO Ampliación Cantera 3.874



MINISTERIO DE AMBIENTE

Expte 2022/010274
R.M. 1350/2025

Montevideo, 24 OCT. 2025

VISTO: la solicitud de ampliación presentada por INCOCI S.A., respecto de la autorización concedida por la Resolución Ministerial N° 788/022, de 12 de setiembre de 2022 (Exp. N° 2022/36001/010274);

RESULTANDO: I) que dicha Resolución concedió a INCOCI S.A. Autorización Ambiental Previa para su proyecto de extracción de tosca y piedra partida ubicado en el padrón N° 3874 de la 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida, y Autorización Ambiental de Operación para la extracción de un volumen de hasta 116.000 m³ (ciento dieciséis mil metros cúbicos) de material, por el plazo de 30 meses contados desde la fecha de inicio de los trabajos;

II) que el 8 de setiembre de 2023, la interesada presentó una solicitud de ampliación de las autorizaciones concedidas en volumen y plazo;

III) que durante la tramitación, el Área Evaluación Ambiental realizó una solicitud de información complementaria el 6 de mayo de 2024, la cual fue constada por la interesada el 8 de mayo de 2024;

IV) que por informe de 11 de junio de 2024 el Área Evaluación Ambiental sugiere ampliar la Autorización Ambiental Previa y conceder la Autorización Ambiental de Operación para la extracción de hasta 121.000 m³ (ciento veintiún mil metros cúbicos) de tosca y piedra partida por el plazo de 12 meses adicionales;

V) que el Área Jurídica informa que conforme a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005) el plazo de ampliación de la Autorización Ambiental de Operación no puede superar los 3 años o 36 meses por lo que sugiere conceder la ampliación para el mismo volumen por el plazo de 6 meses contados desde la notificación de la presente resolución, previniendo a la interesada que en caso de querer continuar con las actividades deberá presentar la solicitud de

renovación de Autorización Ambiental de Operación;

CONSIDERANDO: que habrá de procederse según lo sugerido por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, autorizando la ampliación solicitada, y otorgando la Autorización Ambiental de Operación, ya que de la ampliación del presente proyecto solo se derivarían solo impactos ambientales negativos no significativos;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, los artículos 291 y siguientes de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, los artículos 511 y siguientes de la Ley N° 19.024, de 18 de diciembre de 2020 y el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

EL MINISTRO DE AMBIENTE

RESUELVE:

1°. Ampliase la Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación concedida por la Resolución Ministerial N° 788/022, de 12 de setiembre de 2022 a INCOCI S.A. (RUT N° 212211750014), para su proyecto de extracción de tosca y piedra partida ubicado en el padrón N° 3874 de la 1ª Sección Catastral del Departamento de Florida.

2°. La ampliación referida en el ordinal anterior se concede sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitación de la presente resolución y de las siguientes condiciones:

- a) Toda modificación al proyecto deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), por escrito, para su análisis y eventual aprobación previa.
- b) De constatare impactos ambientales no previstos originalmente, se deberán establecer medidas de mitigación y presentarlas ante la DINACEA para su correspondiente aprobación.
- c) En caso que se generen residuos categoría I de acuerdo al Decreto N° 182/013, de 20 de junio de 2013, deberán ser almacenados



**Ministerio
de Ambiente**


transitoriamente en una zona techada, con piso de hormigón y cordoneta de seguridad y dispuestos mediante gestor autorizado, no pudiendo acopiarse por un plazo mayor a 12 meses.

- d) Dentro del plazo de 2 (dos) meses de finalizada la ejecución del proyecto, deberá presentar ante DINACEA un informe de cierre del trabajo realizado, el que deberá contar con fotografías obtenidas desde sitios georreferenciados, que muestren la situación previa al inicio de la actividad, durante la actividad y posterior al abandono, volumen total de material extraído, resultados de los monitoreos, remitos de entregas de residuos categoría I a gestores autorizados y plano altimétrico de la situación final del proyecto.

3°. La Autorización Ambiental de Operación referida en los ordinales anteriores se concede por el plazo de 6 (seis) meses contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución, y para un volumen total de extracción adicional de hasta 121.000 m³ (ciento veintiún mil metros cúbicos), previniéndose que, con antelación a su vencimiento la interesada deberá solicitar su renovación a los efectos de poder continuar operando su proyecto, salvo que se introduzcan modificaciones, reformas o ampliaciones significativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 del Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005.

4°. Esta Resolución se dicta en aplicación de las normas en que se funda, por lo que es sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones y de los derechos que a terceros pudieran corresponder.

5°. Notifíquese al interesado, y remítase copia de la presente Resolución al Departamento de Tesorería de esta Secretaría de Estado. Cumplido, siga a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.




Ing. Agr. Oscar Caputi
Ministro (I) de Ambiente

Constancia de mantenimiento de equipos

CRE19	Fecha: 23-07-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Jorge Eduardo Rodríguez Ramírez	9077	Cambio Aceite Transmisión Cambio Filtro Hidráulico Cambio Aceite Diferencial Cambio aceite mandos finales Cambio Filtro Transmisión Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
TRI4P	Fecha: 23-07-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Lucas Vidal Ferreira	3300	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire Cambio Filtro Hidráulico Cambio Aceite Hidráulico
EXC13	Fecha: 22-07-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Francisco César Martino Montes de Oca	17500	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Hidráulico Cambio Filtro Aire Cambio aceite motor giro Filtros de cabina (AC)
CU19	Fecha: 15-07-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Kelvin Eduardo Olivera Rodríguez	91500	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible
CV23	Fecha: 14-07-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Ricardo Fabian Rodriguez Gonzalez	153610	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
EC2	Fecha: 10-07-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Leonardo Adrian Umplierrez Villaneal	1758	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CVA12	Fecha: 10-07-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Facundo Santiago Pereira Castro	7819	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
MNV10	Fecha: 07-07-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Leandro Paulino Gutierrez Cabrera	12135	Cambio Filtro Hidráulico Cambio Filtro Transmisión Filtros de cabina (AC) Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CG1	Fecha: 27-08-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Sebastián Bellini Islas	369552	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire Cambio filtro de agua
CV44	Fecha: 21-08-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: César Adrián Bellini Islas	26300	Cambio Aceite Diferencial Cambio aceite caja de cambios Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CV26	Fecha: 20-08-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Alfredo Sebastian Marquez Silva	Medidor: 10983 / Real:146083 + 135100 por reset del medidor fecha: 01-02-2025	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CV20	Fecha: 20-08-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Waldemar Sebastián Molina Martínez	Medidor: 272081 / Real:336081 + 21000 por reset del medidor fecha: 16-09-2022 + 43000 por reset del medidor fecha: 15-03-2022	Cambio aceite caja de cambios Filtro de dirección hidráulica Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio filtro de agua Cambio Filtro Aire
CV35	Fecha: 20-08-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Pablo Enrique Rodríguez Martínez	95840	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
EXC22	Fecha: 20-08-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Danilo Bajales	5189	Cambio Aceite Hidráulico Filtros de cabina (AC) Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
EXC18	Fecha: 20-08-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Darwín Darío Fernández Etchissure	12265	Filtros de cabina (AC) Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire

EXC17	Fecha: 19-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Gastón Figueroa Molina	13050	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CV15	Fecha: 19-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Heber David Cordero Vera	558350	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CV24	Fecha: 17-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Rodolfo Yamandú Sanabria Bonilla	142994	Cambio de líquido refrigerante Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CV29	Fecha: 16-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Jose Victor Revetria	116300	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
EXC19	Fecha: 15-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Darwin Darío Fernández Etchissure	10300	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire Cambio aceite motor giro Cambio aceite mandos finales
CV33	Fecha: 11-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Hugo Rafael García	109600	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
EXC20	Fecha: 10-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Hugo Efraín Machado Quintana	10000	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
MB1	Fecha: 08-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Federico Sellanes Díaz	5840	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CU20	Fecha: 02-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: José Eduardo Machín Quijada	206000	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire
CV39	Fecha: 02-09-2025 Obra / Sector: RUTA 5 Funcionario: Dardo Joan Curbelo de Olivera	90281	Cambio Aceite Cambio Filtro Aceite Cambio Filtro Combustible Cambio Filtro Aire


Constancia de gestión de residuos CAT I

 INCOCI CONSTRUYENDO EL PAÍS	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 3
Fecha: 4-7-2025		Receptor de Residuos: vertedero Municipal	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN: 300 LTJ			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO: 300 LTJ			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS: 300 LTJ			
Otros:			
Sector / Obra: 080202 RS KM 107			
Firma del que entrega: 		Firma del que recibe: CARLOS GAMARRA	
Aclaración de firma: FERNANDO LORA		Ac : CARLOS GAMARRA	

 INCOCI CONSTRUYENDO EL PAÍS	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 3
Fecha: 8/08/2025		Receptor de Residuos: vertedero	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN: 600			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO: 400			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS: 600			
Otros:			
Sector / Obra: Rutas			
Firma del que entrega: 		Firma del que recibe: 	
Aclaración de firma: FERNANDO LORA		Aclaración de firma:	

 INCOCI <small>CONSTRUYENDO EL PAÍS</small>	REGISTRO DE SGI		Código: RC 7571b
	CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
	REF: IT 7113		Revisión: 3
Fecha: <u>5/9/2025</u>		Receptor de Residuos: <u>verteadero</u>	
Cantidad de Residuos PAPEL Y CARTÓN: <u>400</u>			
Cantidad de Residuos NYLON Y PLÁSTICO: <u>400</u>			
Cantidad de Residuos ASIMILABLES A DOMÉSTICOS: <u>450</u>			
Otros:			
Sector / Obra: <u>Ruta 5</u>			
Firma del que entrega: <u>Fernando Ochoa</u>		Firma del que recibe: <u>[Firma]</u>	
Aclaración de firma: <u>[Firma]</u>		Aclaración de firma:	

Constancia de gestión de residuos CAT II


PETROMOBIL SAS

ORDEN DE SERVICIO

MONTEVIDEO - URUGUAY
 TELS.: 2304 4974 - 2307 5984
 E-mail: info@petromobil.com.uy
 Web: www.petromobil.com.uy


Nº 004313

FECHA DE SERVICIO










24725

MATRÍCULA DEL CAMIÓN EN SERVICIO

S4P5562



Datos de Cadena de Gestión

GENERADORA Fecha: 24/7/25 Hora: 14:30	Empresa: INCOCI R.U.T.: X212211750079	Dirección/ Teléfono Contacto: RUTA 57 y 3 TRINIDAD FLORES	 Firma/ Aclaración
TRANSPORTISTA Fecha: 24/7/25 Hora: 14:30	Empresa: Petromobil SAS R.U.T.: 21 885320 0012	Dirección/ Teléfono Contacto: Camello de Azardum 5990 2304 4974	 Firma/ Aclaración
ACOFIO Fecha:  Hora: 	Empresa: PETROMOBIL SAS R.U.T.: 218853200019	Dirección/ Teléfono Contacto: // // //	 Firma/ Aclaración
DESTINO FINAL Fecha:  Hora: 	Empresa:  R.U.T.: 	Dirección/ Teléfono Contacto:	Firma/ Aclaración

Datos de Residuos

Descripción:	Descripción	Kg./L./Unidades	Observaciones
ACEITE LUB	I / II	8 cartuchos	
EN DESUSO	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		
	I / II		

INCOCI S.R.L. - TEL: 2304 4974 - FAX: 2307 5984 - CORREO: info@petromobil.com.uy - WWW: www.petromobil.com.uy

Constancia de gestión de BB.QQ

AC Químicos
Alquiler de Baños Químicos
José Beloni 5851 - Montevideo
Tel: 2254 11 28
Cel: 999 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

RUT 92 022157 0017
REMITO
Serie A

Nº 155260

INSTALACION ☐ RETRO ☐ CAMBIO ☒ DIA MES AÑO 24 07 2025

Señor: INCOCI C.I. Nº _____
en representación de: RUTA 5
con domicilio en: _____
Dirección de entrega: _____
Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO		UNIDAD DE MEDIDA	
LLEGADA: 07:25	BAÑO QUÍMICO	596	
SALIDA: 07:30	BAÑO A LA RED		
VEHÍCULO: 24	DUCHA		
	BOLETERIA		
	CABINA VIGILANCIA		

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUÍMICOS ☐

PAPEL HIGIÉNICO ☐ ROLLOS BAROMÉTRICA ☒

PAPEL TOALLA ☒ ROLLOS LIMPIEZA ☒

NEUTRALIZANTE DE CLORO: 1 LITROS

NUMERO DE FUNCIONARIO: 3 5 5

DESCRIPCIONES: _____

IMPRESA AUTORIZADA: RUT 21 420196 0011
CONSTANCIA AUTORIZADA: 420196-0011
REMITO A: 155260 AL 155260 x2 VAS
IMPRESA AUTORIZADA: 155260-0011

VENCIMIENTO DGI 10/04/2026

RECIBO CONDICIONES AL DUEÑO
FIRMA: [Firma]
ACIARACIÓN: _____
C.I.: _____

AC Químicos
Alquiler de Baños Químicos
José Beloni 5851 - Montevideo
Tel: 2254 11 28
Cel: 999 590 782
bquimicos@hotmail.com
www.alquilerquimicos.com

RUT 92 022157 0017
REMITO
Serie A

Nº 155251

INSTALACION ☐ RETRO ☐ CAMBIO ☒ DIA MES AÑO 22 07 2025

Señor: INCOCI C.I. Nº _____
en representación de: RUTA 5
con domicilio en: _____
Dirección de entrega: _____
Remitimos a Ud(s) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO		UNIDAD DE MEDIDA	
LLEGADA: 07:25	BAÑO QUÍMICO	596	
SALIDA: 07:30	BAÑO A LA RED		
VEHÍCULO: 24	DUCHA		
	BOLETERIA		
	CABINA VIGILANCIA		

MANTENIMIENTO

PROPIEDAD CLIENTE ☐ AC QUÍMICOS ☐

PAPEL HIGIÉNICO ☐ ROLLOS BAROMÉTRICA ☒

PAPEL TOALLA ☒ ROLLOS LIMPIEZA ☒

NEUTRALIZANTE DE CLORO: 1 LITROS


NUMERO DE FUNCIONARIO: 3 5 5

DESCRIPCIONES: _____

IMPRESA AUTORIZADA: RUT 21 420196 0011
CONSTANCIA AUTORIZADA: 420196-0011
REMITO A: 155251 AL 155251 x2 VAS
IMPRESA AUTORIZADA: 155251-0011

VENCIMIENTO DGI 10/04/2026

RECIBO CONDICIONES AL DUEÑO
FIRMA: [Firma]
ACIARACIÓN: [Firma]
C.I.: 4522550-2

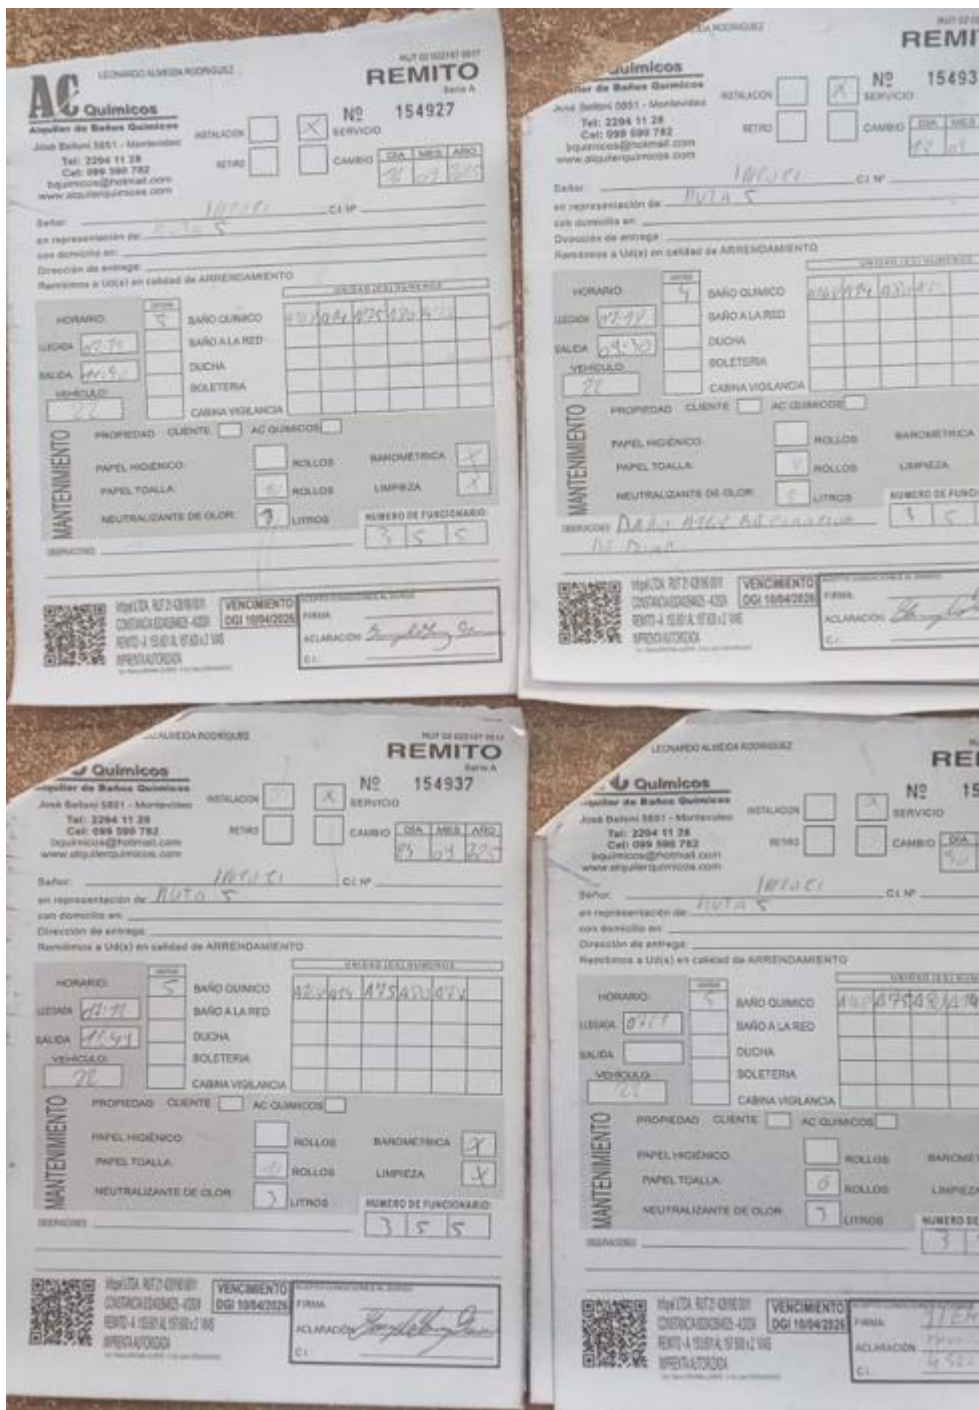

REMITO
Baños Químicos
No. 154927

SEÑOR: []
en representación de: []
con domicilio en: []
Dirección de entrega: []
Remite a (Ux) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO: []
LUGAR: []
SALIDA: []
VEHICULO: []

BAÑO QUÍMICO []
BAÑO A LA RED []
DUCHA []
BOILETERIA []
CABINA VIOLANCIA []

PROPIEDAD: [] CLIENTE: [] ACQUIMCOS: []

PAPEL HIGIENICO [] ROLLOS [] BANCHEMICA []
PAPEL TOALLA [] ROLLOS [] LIMPIEZA []
NEUTRALIZANTE DE CLORO [] LITROS []

NUMERO DE FUNCIONARIO: []

FECHA: []
FIRMA: []
ACREDITACION: []
CI: []

REMITO
Baños Químicos
No. 154932

SEÑOR: []
en representación de: []
con domicilio en: []
Dirección de entrega: []
Remite a (Ux) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO: []
LUGAR: []
SALIDA: []
VEHICULO: []

BAÑO QUÍMICO []
BAÑO A LA RED []
DUCHA []
BOILETERIA []
CABINA VIOLANCIA []

PROPIEDAD: [] CLIENTE: [] ACQUIMCOS: []

PAPEL HIGIENICO [] ROLLOS [] BANCHEMICA []
PAPEL TOALLA [] ROLLOS [] LIMPIEZA []
NEUTRALIZANTE DE CLORO [] LITROS []

NUMERO DE FUNCIONARIO: []

FECHA: []
FIRMA: []
ACREDITACION: []
CI: []

REMITO
Baños Químicos
No. 154937

SEÑOR: []
en representación de: []
con domicilio en: []
Dirección de entrega: []
Remite a (Ux) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO: []
LUGAR: []
SALIDA: []
VEHICULO: []

BAÑO QUÍMICO []
BAÑO A LA RED []
DUCHA []
BOILETERIA []
CABINA VIOLANCIA []

PROPIEDAD: [] CLIENTE: [] ACQUIMCOS: []

PAPEL HIGIENICO [] ROLLOS [] BANCHEMICA []
PAPEL TOALLA [] ROLLOS [] LIMPIEZA []
NEUTRALIZANTE DE CLORO [] LITROS []

NUMERO DE FUNCIONARIO: []

FECHA: []
FIRMA: []
ACREDITACION: []
CI: []

REMITO
Baños Químicos
No. 15

SEÑOR: []
en representación de: []
con domicilio en: []
Dirección de entrega: []
Remite a (Ux) en calidad de ARRENDAMIENTO

HORARIO: []
LUGAR: []
SALIDA: []
VEHICULO: []

BAÑO QUÍMICO []
BAÑO A LA RED []
DUCHA []
BOILETERIA []
CABINA VIOLANCIA []

PROPIEDAD: [] CLIENTE: [] ACQUIMCOS: []

PAPEL HIGIENICO [] ROLLOS [] BANCHEMICA []
PAPEL TOALLA [] ROLLOS [] LIMPIEZA []
NEUTRALIZANTE DE CLORO [] LITROS []

NUMERO DE FUNCIONARIO: []

FECHA: []
FIRMA: []
ACREDITACION: []
CI: []
