



11 de julio de 2025

Informe Ambiental Final

Licitacion I/45

**Proyecto y Ejecución de la Iluminación de la Ruta 5 –
Bypass Centenario, desde la progresiva 4km900 hasta la
progresiva 7km750**



El presente Informe correspondiente a las obras de la licitación I/45 “ Proyecto y Ejecución de la Iluminación del la Ruta 5-Bypass Centenario, desde 4k900 hasta 7K750”, refiere a los siguientes ítems:

- Residuos sólidos domésticos.
- Recuperación de las zonas afectadas por las obras.
- Retiro y disposición final de todo tipo de materiales ubicado en la zona de obras.
- Baños químicos

Residuos sólidos domésticos

El personal de la empresa se alojó en una casa habitación alquilada en la ciudad de Paso de los Toros y los residuos domiciliarios generados se depositaron en los contenedores del municipio.

Recuperación de las zonas afectadas por las obras

Todos los trabajos fueron ejecutados dentro de la faja de uso público y el material excavado se reutilizó para el relleno de zanja y la conformación de los taludes.

El suelo vegetal se reutilizó para generar el tapiz para la restauración vegetal.

Retiro y disposición final de todo tipo de materiales ubicado en la zona de obras

-Elaboración de hormigón

Para la elaboración de hormigón en sitio se acopiaron los áridos necesarios para la ejecución de cada día sobre camión por lo que no se generaron sobrantes de hormigón, ni sobrantes de áridos en la faja de uso público.



- Columnas y Luminarias.

Las columnas se enviaban prontas para su instalación, se acopiaban en lugares cercanos a las zonas de postación y se procedía a su colocación. No generaban residuos.

Las luminarias eran enviadas prontas para su instalación embaladas en cajas de cartón. El cartón generado luego de la instalación de las mismas se enviaba a sede central de la empresa para su disposición final de acuerdo al instructivo P.A. 09.02-02 -Gestión de Residuos en Obras de Instalación.

- Otros residuos.

Bobinas para embalaje de conductores, restos cables, etc., también se enviaban a sede central de la empresa para su disposición final de acuerdo al instructivo arriba señalado.


Baños químicos

Se utilizaron baños químicos portátiles de la empresa AC Químicos que se encargaba del servicio barométrico de los mismos.

No se registraron Accidentes Ambientales en esta obra.

Se adjuntan fotos que muestran el estado final de la obra



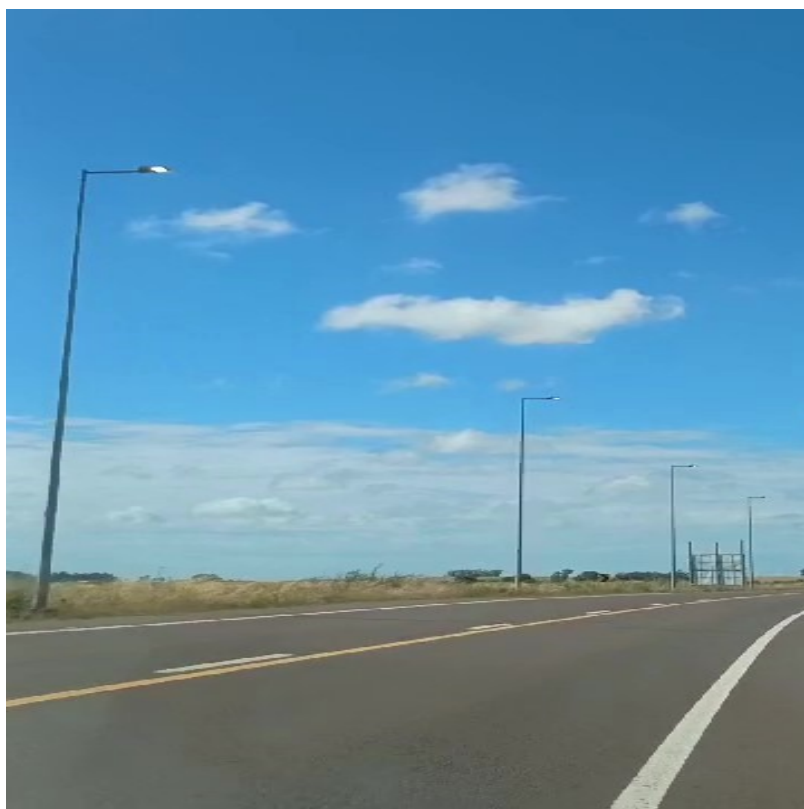



Por CCH Instalaciones S.A.

Ing. Luc Chapt
