

MODIFICACIÓN Y AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 26 de mayo de 2021, **POR UNA PARTE:** El Ec. José Luis Puig, titular de la cédula de identidad N° 1.376.455-4 y el Ing. Ramón Díaz Velazco, titular de la cédula de identidad N° 1.297.316-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), **POR OTRA PARTE:** MELITER S.A. (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Cr. Nicolas Olasso, titular de la cédula de identidad N°4.053.407-9 y constituyendo domicilio en la calle Avenida Italia 6795 de esta ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación N° C/124* para la ejecución de obra "**Camino a la Balsa – Tramo 31km950 – 58km400**", habiéndose recibido las ofertas el día 27 de mayo de 2019. Por resolución del Directorio del día 11 de setiembre del 2019, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *MELITER S.A.* suscribiéndose contrato el día 25 de setiembre de 2019.
- II) Por expediente N° 4810/2020 el MTOP solicita gestionar una modificación y ampliación de contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 05 de mayo de 2021 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la modificación y ampliación de contrato solicitada.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan modificar y ampliar el contrato original, a los efectos de realizar una variante planimétrica (variante Cerrezuelo) ya que se constata la existencia de una senda al Paso del Billar y usando la misma, la distancia se reduce en unos 30 kms desde La Paloma al nuevo puente en construcción. Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con el Anexo I (Cuadro de Metrajes) de este contrato que se agrega y forma parte del mismo.

TERCERO – PRECIO

La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto básico del Contrato de **\$49:549.711,48** (pesos uruguayos cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil setecientos once con 48/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto total básico contratado es de **\$277:015.040,22** (pesos uruguayos doscientos setenta y siete millones quince mil cuarenta con 22/100) de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos de **\$7:433.194,42** (pesos uruguayos siete millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento noventa y cuatro con 42/100) sin impuestos. Considerando lo



anterior el Monto Imponible total es de **\$41.552.256,03** (pesos uruguayos cuarenta y un millones quinientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y seis con 03/100).

QUINTO – PLAZO

El plazo para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, es de 6 (seis) meses de acuerdo al Anexo II del presente contrato que se agrega y forma parte del mismo.

SEXTO – GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro del Banco de Seguros del Estado, Póliza N° 6077831/0 por un monto de USD 57.000 (dólares americanos cincuenta y siete mil 00/100).

SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se mantiene el Período de Responsabilidad previsto en el Contrato original de fecha 25 de setiembre de 2019.

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 25 de setiembre de 2019 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.


DECIMO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO – VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

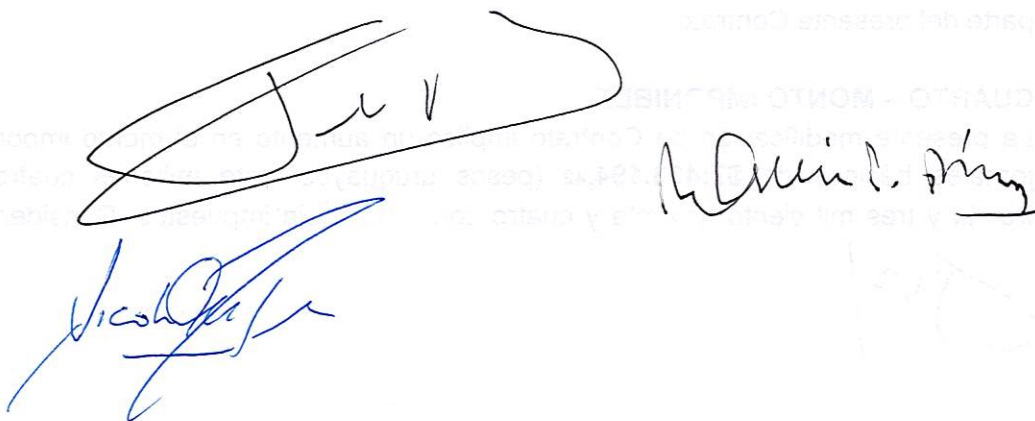

ANEXO I



Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unit.	Importe
I	1	Movilización	Global	1,00	6.825.600,00	6.825.600,00
II	6	Excavación no clasificada	m3	93.352,00	230,40	21.508.300,80
II	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	50.490,00	163,20	8.239.968,00
II	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	39.200,00	230,40	9.031.680,00
II	9	Extracción de arboles	c/u	641,00	940,80	603.052,80
II	25	Escarificado, conformación y compactación de capa	m2	216.600,00	7,68	1.663.488,00
II	26	Ensanche de plataforma	m	32.710,00	238,08	7.787.596,80
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	8.310.452,00	8.310.452,00
III	76	Sobretransporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3.km	269.000,00	18,24	4.906.560,00
IV	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	6.380,45	6.000,00	38.282.700,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	216.200,00	11,52	2.490.624,00
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	46.000,00	21,12	971.520,00
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	165.600,00	38,40	6.359.040,00
VII	131	Base granular CBR> 60%	m3	109.048,00	345,60	37.686.988,80
VII	131-1	Base granular CBR> 60%	m3	59.916,00	384,00	23.007.744,00
VII	134	Material de base estabilizado con cemento Portland	m3	525,00	1.008,00	529.200,00
VII	135	Material granular para bacheo previo	m3	1.519,00	566,40	860.361,60
VII	181	Reciclado de pavimentos	m2	273.321,00	76,80	20.991.052,80
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	3.864,00	1.392,00	5.378.688,00
IX	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	1.081,00	480,00	518.880,00
XIII	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.)	m3	119,00	28.320,00	3.370.080,00
XIII	262	Hormigón armado clase VII para losas	m3	22,50	20.640,00	464.400,00
XIII	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	223,30	26.400,00	5.895.120,00
XIII	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	m	609,00	4.704,00	2.864.736,00
XIII	266	Caños de hormigón armado 0,60 m	m	209,00	5.664,00	1.183.776,00
XIII	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	320,00	7.584,00	2.426.880,00
XIII	268	Caños de hormigón armado 1,00 m	m	169,00	10.464,00	1.768.416,00
XIV	269	Caños de hormigón armado 1,20 m	ml	126,00	14.688,00	1.850.688,00
XIV	311	Alambrados nuevos	m	21.021,00	364,80	7.668.460,80
XVII	382	Señalización de obra	Global	1,00	1.385.075,00	1.385.075,00
XLI	621-2	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	1.660,00	2.112,00	3.505.920,00
LXXX	912	Alimentación	per.mes	75,00	36.480,00	2.736.000,00
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	veh.mes	21,00	96.000,00	2.016.000,00
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	veh.mes	42,00	62.400,00	2.620.800,00
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	casa.mes	21,00	35.520,00	745.920,00
LXXXIX	930	Alojamiento gerente de obra	per.mes	21,00	38.400,00	806.400,00
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	216,20	23.520,00	5.085.024,00
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m	m3	565,80	25.440,00	14.393.952,00
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	203,00	5.088,00	1.032.864,00
CCCI	3027	Poste para señal instalado	m3	13,50	90.240,00	1.218.240,00
CCCI	3028	Poste para chebron instalado	m3	11,20	249.600,00	2.795.520,00
CCCI	3029	Poste kilometrico instalado	m3	3,35	100.800,00	337.680,00
CCCIV	3037	Línea de eje aplicado en frio	m2	1.333,00	240,00	319.920,00
CCCIV	3038	Línea de borde aplicado en frio	m2	10.676,00	240,00	2.562.240,00
CCCIV	3039	Amarillo aplicado en frio	m2	5.338,00	240,00	1.281.120,00
CCCIV	3040	Superficies aplicadas en frio	m2	170,00	624,00	106.080,00
CCCIV	3042	Tachas instaladas	c/u	2.960,00	168,00	497.280,00
CDVII	4063	Elementos de contralor	Global	1,00	122.950,82	122.950,82
						277.015.040,22

ANEXO II

lv



Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unit.	Importe	Acumulado Abril 21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	set-21	Oct-21
I	1	Movilización	Global	1,00	6.825.600,00	6.825.600,00	100,00%						
II	6	Excavación no clasificada	m3	93.352,00	230,40	21.508.300,80	93,42%	5,00%	12,00%	5,00%	9,00%		
II	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	50.490,00	163,20	8.239.968,00	110,56%	8,00%	12,00%	5,00%	9,00%		
II	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	39.200,00	230,40	9.031.680,00	66,35%	10,00%	8,00%	5,00%	9,00%		
II	9	Extracción de arboles	c/u	641,00	940,80	603.052,80	20,59%	50,00%					
II	25	Escarificado, conformación y compactación de capa	m2	216.600,00	7,68	1.663.488,00	106,20%						
II	26	Ensanche de plataforma	m	32.710,00	238,08	7.787.596,80	75,97%	3,00%	7,00%	12,00%	2,00%		
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00			40,98%	9,00%					
III	76	Sobretaponaje de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3.km	269.000,00	18,24	4.906.560,00	41,07%						
IV	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	6.380,45	6.000,00	38.282.700,00	63,01%	5,00%	20,00%	25,00%	14,00%	10,00%	18,00%
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	216.200,00	11,52	2.490.624,00	82,81%						10,00%
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	46.000,00	21,12	971.520,00	0,00%						7,00%
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	165.600,00	38,40	6.359.040,00	104,76%						50,00%
VII	131-1	Base granular CBR> 60%	m3	109.048,00	345,60	37.686.988,80	75,10%	5,00%	9,00%	10,00%	8,00%	3,00%	
VII	131-2	Base granular CBR> 60%	m3	59.916,00	384,00	23.007.744,00	73,97%	7,00%	8,00%	10,00%	8,00%	3,00%	
VII	134	Material de base estabilizado con cemento Portland	m3	525,00	1.008,00	529.200,00	0,00%		35,00%	35,00%	30,00%		
VII	135	Material granular para bacheo previo	m3	1.519,00	566,40	860.361,60	175,05%						
VII	181	Reciclado de pavimentos	m2	273.321,00	76,80	20.991.052,80	69,28%	5,00%			4,00%	10,00%	10,38%
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	3.864,00	1.392,00	5.378.688,00	97,77%						
IX	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	1.081,00	480,00	518.880,00	117,58%						
XIII	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.)	m3	119,00	28.320,00	3.370.080,00	122,40%						
XIII	262	Hormigón armado clase VII para losas	m3	22,50	20.640,00	464.400,00	0,00%						
XIII	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	223,30	26.400,00	5.895.120,00	56,18%						
XIII	265	Caños de hormigón armado 0,50 m	m	609,00	4.704,00	2.864.736,00	84,24%						
XIII	266	Caños de hormigón armado 0,60 m	m	209,00	5.664,00	1.183.776,00	36,36%		7,00%				
XIII	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	320,00	7.584,00	2.426.880,00	59,38%		15,00%				
XIII	268	Caños de hormigón armado 1,00 m	m	169,00	10.464,00	1.768.416,00	200,51%						
XIII	269	Caños de hormigón armado 1,20 m	m	126,00	14.688,00	1.850.688,00	0,00%		40,00%	20,00%		40,00%	
XIV	311	Alambrados nuevos	m	21.021,00	364,80	7.668.460,80	94,24%						
XVII	382	Señalización de obra	Global	1,00	1.385.075,00	1.385.075,00	81,80%						
XLI	621-2	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	1.660,00	2.112,00	3.505.920,00	0,00%						
LXXX	912	Alimentación	per.mes	75,00	36.480,00	2.736.000,00	37,87%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	veh.mes	21,00	96.000,00	2.016.000,00	0,00%						
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	veh.mes	42,00	62.400,00	2.620.800,00	78,57%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	casa.mes	21,00	35.520,00	745.920,00	47,62%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
LXXXIX	930	Alojamiento gerente de obra	per.mes	21,00	38.400,00	806.400,00	42,86%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	216,20	23.520,00	5.085.024,00	65,06%						18,00%
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	565,80	25.440,00	14.393.952,00	94,13%						4,00%
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	203,00	5.088,00	1.032.864,00	0,00%						2,00%
CCCVIII	3028	Poste para señal instalado	m3	13,50	90.240,00	1.218.240,00	0,00%						50,00%
CCCVIII	3028	Poste para chebron instalado	m3	11,20	249.600,00	2.795.520,00	0,00%						50,00%
CCCVIII	3029	Poste kilométrico instalado	m3	3,35	100.800,00	337.680,00	0,00%						50,00%
CCCVIII	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	1.333,00	240,00	319.920,00	0,00%						50,00%
CCCVIII	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	10.676,00	240,00	2.562.240,00	0,00%						50,00%
CCCVIII	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	5.338,00	240,00	1.281.120,00	0,00%						50,00%
CCCVIII	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	170,00	624,00	106.080,00	0,00%						50,00%
CCCVIII	3042	Tachas instaladas	c/u	2.960,00	168,00	497.280,00	0,00%						50,00%
CDVII	4063	Elementos de contralor	Global	1,00	122.950,82	122.950,82	0,00%						50,00%

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unit.	Importe	Acumulado Abril 21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	set-21	Oct-21
I	1	Movilización	Global	1,00	6.825.600,00	6.825.600,00	6.825.600,00	-	-	-	-	-	-
II	6	Excavación no clasificada	m3	93.352,00	230,40	21.508.300,80	20.092.290,05	1.075.415,04	2.580.996,10	1.075.415,04	1.935.747,07	-	-
II	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	50.490,00	163,20	8.239.968,00	9.110.091,65	659.197,44	988.796,16	411.998,40	741.597,12	-	-
II	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	39.200,00	230,40	9.031.680,00	5.992.611,84	903.168,00	722.534,40	451.584,00	812.851,20	-	-
II	9	Extracción de arboles	c/u	641,00	940,80	603.052,80	301.526,40	-	-	-	-	-	-
II	25	Escarificado, conformación y compactación de capa	m2	216.000,00	7,68	1.663.488,00	1.766.573,26	-	-	-	-	-	-
II	26	Ensanche de plataforma	m	32.710,00	238,08	7.787.596,80	5.916.288,00	233.627,90	545.131,78	934.511,62	155.751,94	-	-
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	8.310.452,00	8.310.452,00	3.412.800,00	747.940,68	-	-	-	-	-
III	76	Sobret transporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3.km	269.000,00	18,24	4.906.560,00	2.010.631,68	-	981.312,00	1.226.640,00	686.918,40	-	-
IV	94	Cemento Portland para base estabilizada	ton	6.380,45	6.000,00	38.282.700,00	24.121.632,00	1.914.135,00	-	-	1.531.308,00	3.828.270,00	6.890.886,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	216.200,00	11,52	2.490.624,00	2.062.414,08	-	-	-	-	174.343,68	249.062,40
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	46.000,00	21,12	971.520,00	-	-	-	-	-	485.760,00	127.180,80
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	165.600,00	38,40	6.359.040,00	6.661.977,60	-	-	-	-	-	-
VII	131	Base granular CBR> 60%	m3	109.048,00	345,60	37.686.988,80	28.303.257,60	1.884.349,44	3.391.828,99	3.768.698,88	3.014.959,10	1.130.609,66	-
VII	131-1	Base granular CBR> 60%	m3	59.916,00	384,00	23.007.744,00	17.018.880,00	1.610.542,08	1.840.619,52	2.300.774,40	1.840.619,52	690.232,32	-
VII	134	Material de base estabilizado con cemento Portland	m3	525,00	1.008,00	529.200,00	-	-	185.220,00	185.220,00	158.760,00	-	-
VII	135	Material granular para bacheo previo	m3	1.519,00	566,40	860.361,60	1.506.051,94	-	-	-	-	-	-
VII	181	Reciclado de pavimentos	m2	273.321,00	76,80	20.991.052,80	14.542.771,20	1.049.552,64	-	-	839.642,11	2.099.105,28	2.177.947,60
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	3.864,00	1.392,00	5.378.688,00	5.258.976,00	-	-	-	-	-	-
IX	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	1.081,00	480,00	518.880,00	610.080,00	-	-	-	-	-	-
XIII	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.)	m3	119,00	28.320,00	3.370.080,00	4.125.091,20	-	-	-	-	-	-
XIII	262	Hormigón armado clase VII para losas	m3	22,50	20.640,00	464.400,00	-	-	-	-	-	-	-
XIII	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	223,30	26.400,00	5.895.120,00	3.312.144,00	-	-	-	-	-	-
XIII	265	Cafios de hormigón armado 0,50 m	m	609,00	4.704,00	2.864.736,00	2.413.152,00	-	200.531,52	-	-	-	-
XIII	266	Cafios de hormigón armado 0,60 m	m	209,00	5.664,00	1.183.776,00	430.464,00	-	177.566,40	-	-	-	-
XIII	268	Cafios de hormigón armado 1,00 m	m	320,00	7.584,00	2.426.880,00	1.440.960,00	-	-	-	-	-	-
XIII	267	Cafios de hormigón armado 0,80 m	m	169,00	10.464,00	1.768.416,00	3.545.831,04	-	-	-	-	-	-
XIV	269	Cafios de hormigón armado 1,20 m	m	126,00	14.688,00	1.850.688,00	-	-	-	-	-	-	-
XIV	311	Alambrados nuevos	m	21.021,00	364,80	7.668.460,80	7.227.052,80	-	-	-	-	-	-
XVII	382	Señalización de obra	Global	1,00	1.385.075,00	1.385.075,00	1.133.049,60	-	-	-	-	-	-
XLI	621-2	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	1.660,00	2.112,00	3.505.920,00	-	-	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
LXXX	912	Alimentación	per.mes	75,00	36.480,00	2.736.000,00	1.036.032,00	-	-	-	-	-	-
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	veh.mes	21,00	96.000,00	2.016.000,00	-	-	-	-	-	-	-
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	veh.mes	42,00	62.400,00	2.620.800,00	2.059.200,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	casa.mes	21,00	35.520,00	745.920,00	355.200,00	37.296,00	37.296,00	37.296,00	37.296,00	37.296,00	37.296,00
LXXXIX	930	Alojamiento gerente de obra	per.mes	21,00	38.400,00	806.400,00	345.600,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	216,20	23.520,00	5.085.024,00	3.308.558,40	-	-	-	-	915.304,32	864.454,08
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m	m3	565,80	25.440,00	14.393.952,00	13.549.420,32	-	-	-	-	575.758,08	287.879,04
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	203,00	5.088,00	1.032.864,00	-	-	-	-	-	516.432,00	516.432,00
CCCLII	3027	Poste para señal instalado	m3	13,50	90.240,00	1.218.240,00	-	-	-	-	-	609.120,00	609.120,00
CCCLII	3028	Poste para chevron instalado	m3	11,20	249.600,00	2.795.520,00	-	-	-	-	-	1.397.760,00	1.397.760,00
CCCLII	3029	Poste kilométrico instalado	m3	3,35	100.800,00	337.680,00	-	-	-	-	-	168.840,00	168.840,00
CCCLIV	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	1.333,00	240,00	319.920,00	-	-	-	-	-	159.960,00	159.960,00
CCCLIV	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	10.676,00	240,00	2.562.240,00	-	-	-	-	-	1.281.120,00	1.281.120,00
CCCLV	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	5.338,00	240,00	1.281.120,00	-	-	-	-	-	640.560,00	640.560,00
CCCLV	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	170,00	624,00	106.080,00	-	-	-	-	-	53.040,00	53.040,00
CCCLV	3042	Tachas instaladas	c/u	2.960,00	168,00	497.280,00	-	-	-	-	-	248.640,00	248.640,00
CDVII	4063	Elementos de contralor	Global	1,00	122.950,82	122.950,82	-	-	-	-	-	61.475,41	61.475,41
						277.015.040,22							
Total mes						199.618.867,85	10.724.910,62	11.959.992,86	10.700.298,34	12.063.610,46	15.381.786,75	16.565.573,33	
Total acumulado						199.618.867,85	210.343.778,48	222.303.771,34	233.004.069,68	245.067.680,14	260.449.466,89	277.015.040,22	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
